

VIÑAS NORTE

Renivelación — Lote 10, Manzana 7

Merlot

Levantamiento de niveles de losa (renivelación) previo a la colocación de piso.
Cotas medidas en malla de puntos; el promedio define el espesor de mortero
premezclado y su volumen (m^3) por planta.

Convención: cota negativa = falta nivel (RELLENO) · cota positiva = sobra (CORTE).
Hojas digitalizadas con la GEOMETRÍA EXACTA de muros del despiece (DWG).

Fecha: 01/07/2026

Levantó: Mauricio Gastelum Mora

Resumen de renivelación

Lote	Mza	Modelo	Planta	Área m²	Prom. cm	Mortero m³	Estado
L10	M7	Merlot	P.B.	74.86	1.20	—	No renivelado
L10	M7	Merlot	P.A.	58.25	2.50	1.50	Renivelado
						1.50	TOTAL EJECUTADO
						0.00	TOTAL POR RENIVELAR


Notas y verificación

Color de fila = lote · color de la celda Estado: verde=renivelado, ámbar=no renivelado, azul=por renivelar.


- Verificación foto por foto (zoom + aritmética + geometría): f1=L33 P.A. · f2=L33 P.B. · f3=L9 P.B. (V=2.56) · f4=L9 P.A. (V=1.93; hoja dice 'P.B.' por error) · f5=L10 P.B. (V=1.06) · f6=f7=misma hoja, L10 P.A. (V=1.46).
- L10 M7: P.B. levantada (1.06 m³) pero NO se renivela (prom. 1.2 cm). P.A. renivelada (1.46 ≈ 1.5 m³). Planos de L10 espejados para coincidir con la casa en campo.
- L19 M7 y L17 M7 (Chardonnay): POR RENIVELAR — L19 programado el jueves 2 de julio; L17 sin fecha. Volúmenes = estimación del levantamiento dictado.
- Terrazas (no coladas): fuera de la renivelación.
- ⚠ L17 M7 P.A.: 2.59 m³ no cuadra con 2.24 cm × 59.86 m² (≈1.34 m³). Confirmar antes de pedir mortero.

LOTE 10 · MZA 7 (MERLOT) — PLANTA BAJA

Hoja digitalizada · 74.86 m² · prom. 1.20 cm · mortero levantada, sin ejecutar · hoja: V=1.06 m3

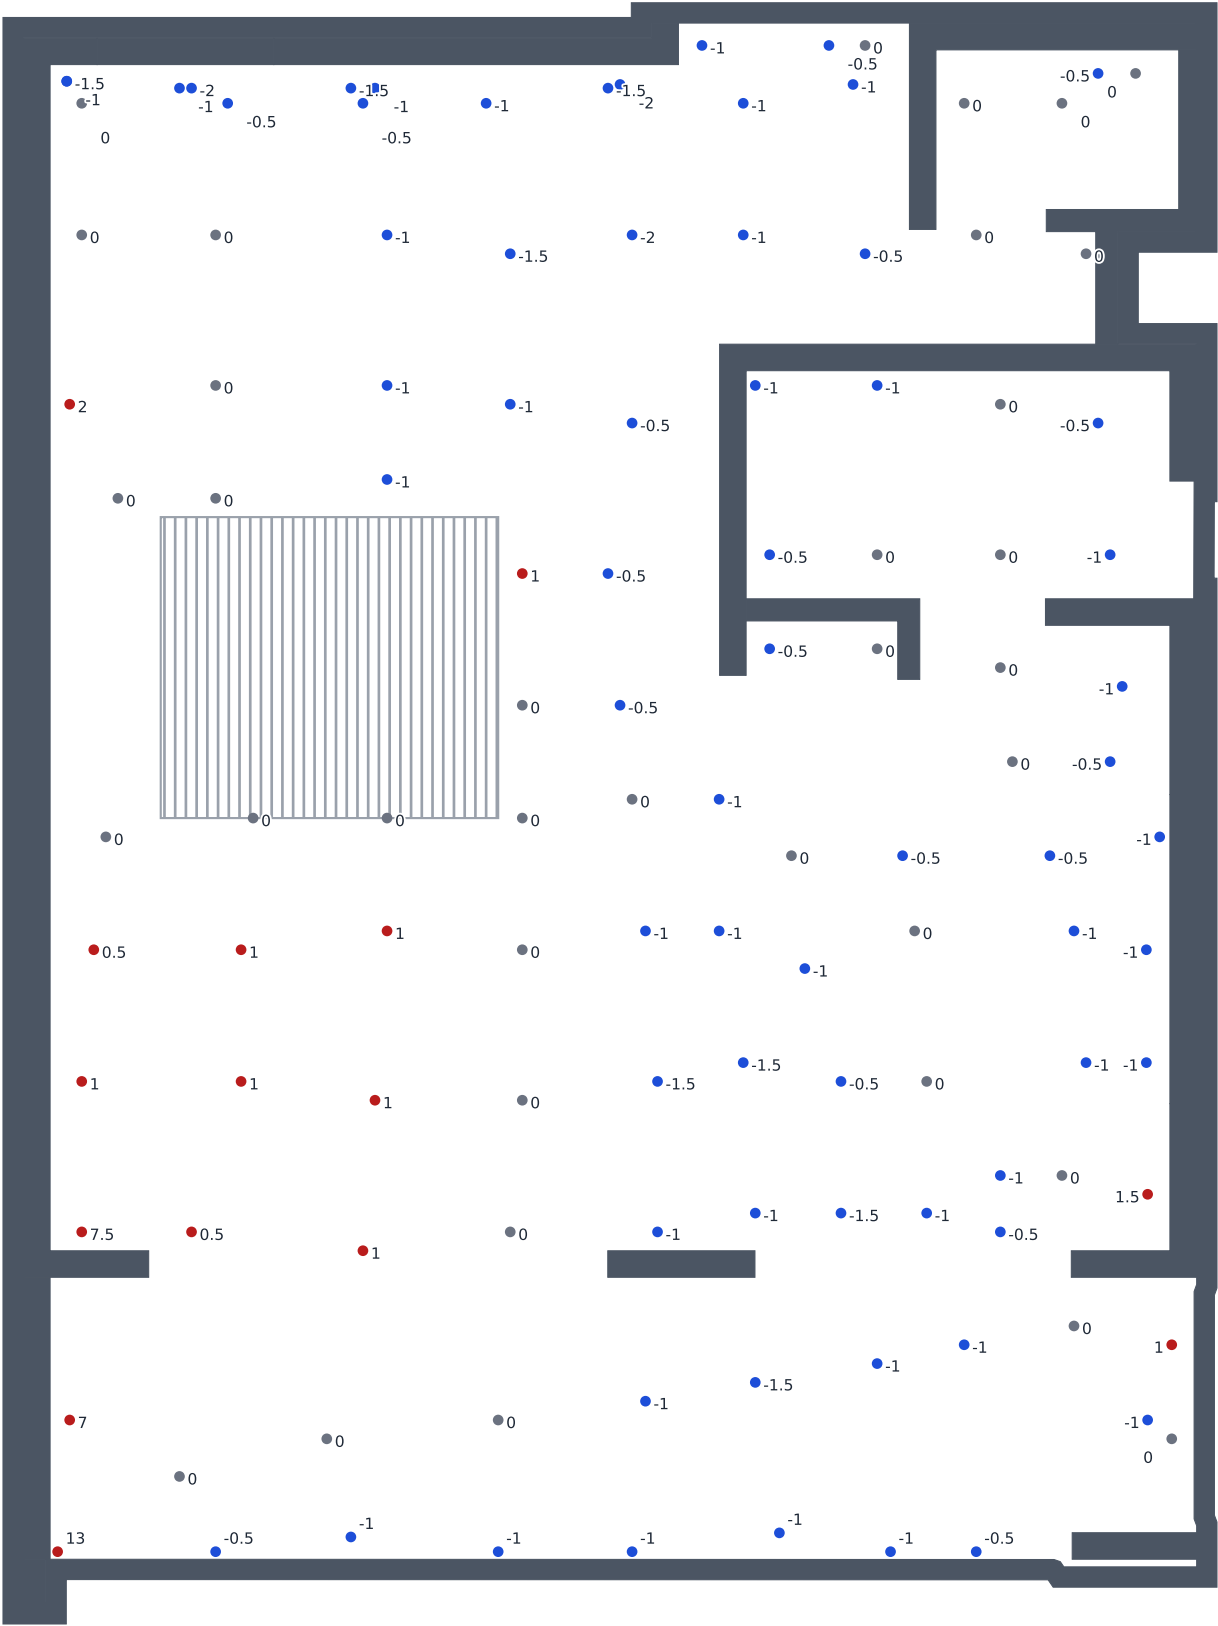


● Relleno (cota -) ● Corte (cota +) ● A nivel (0) ▨ Escalera (hueco)

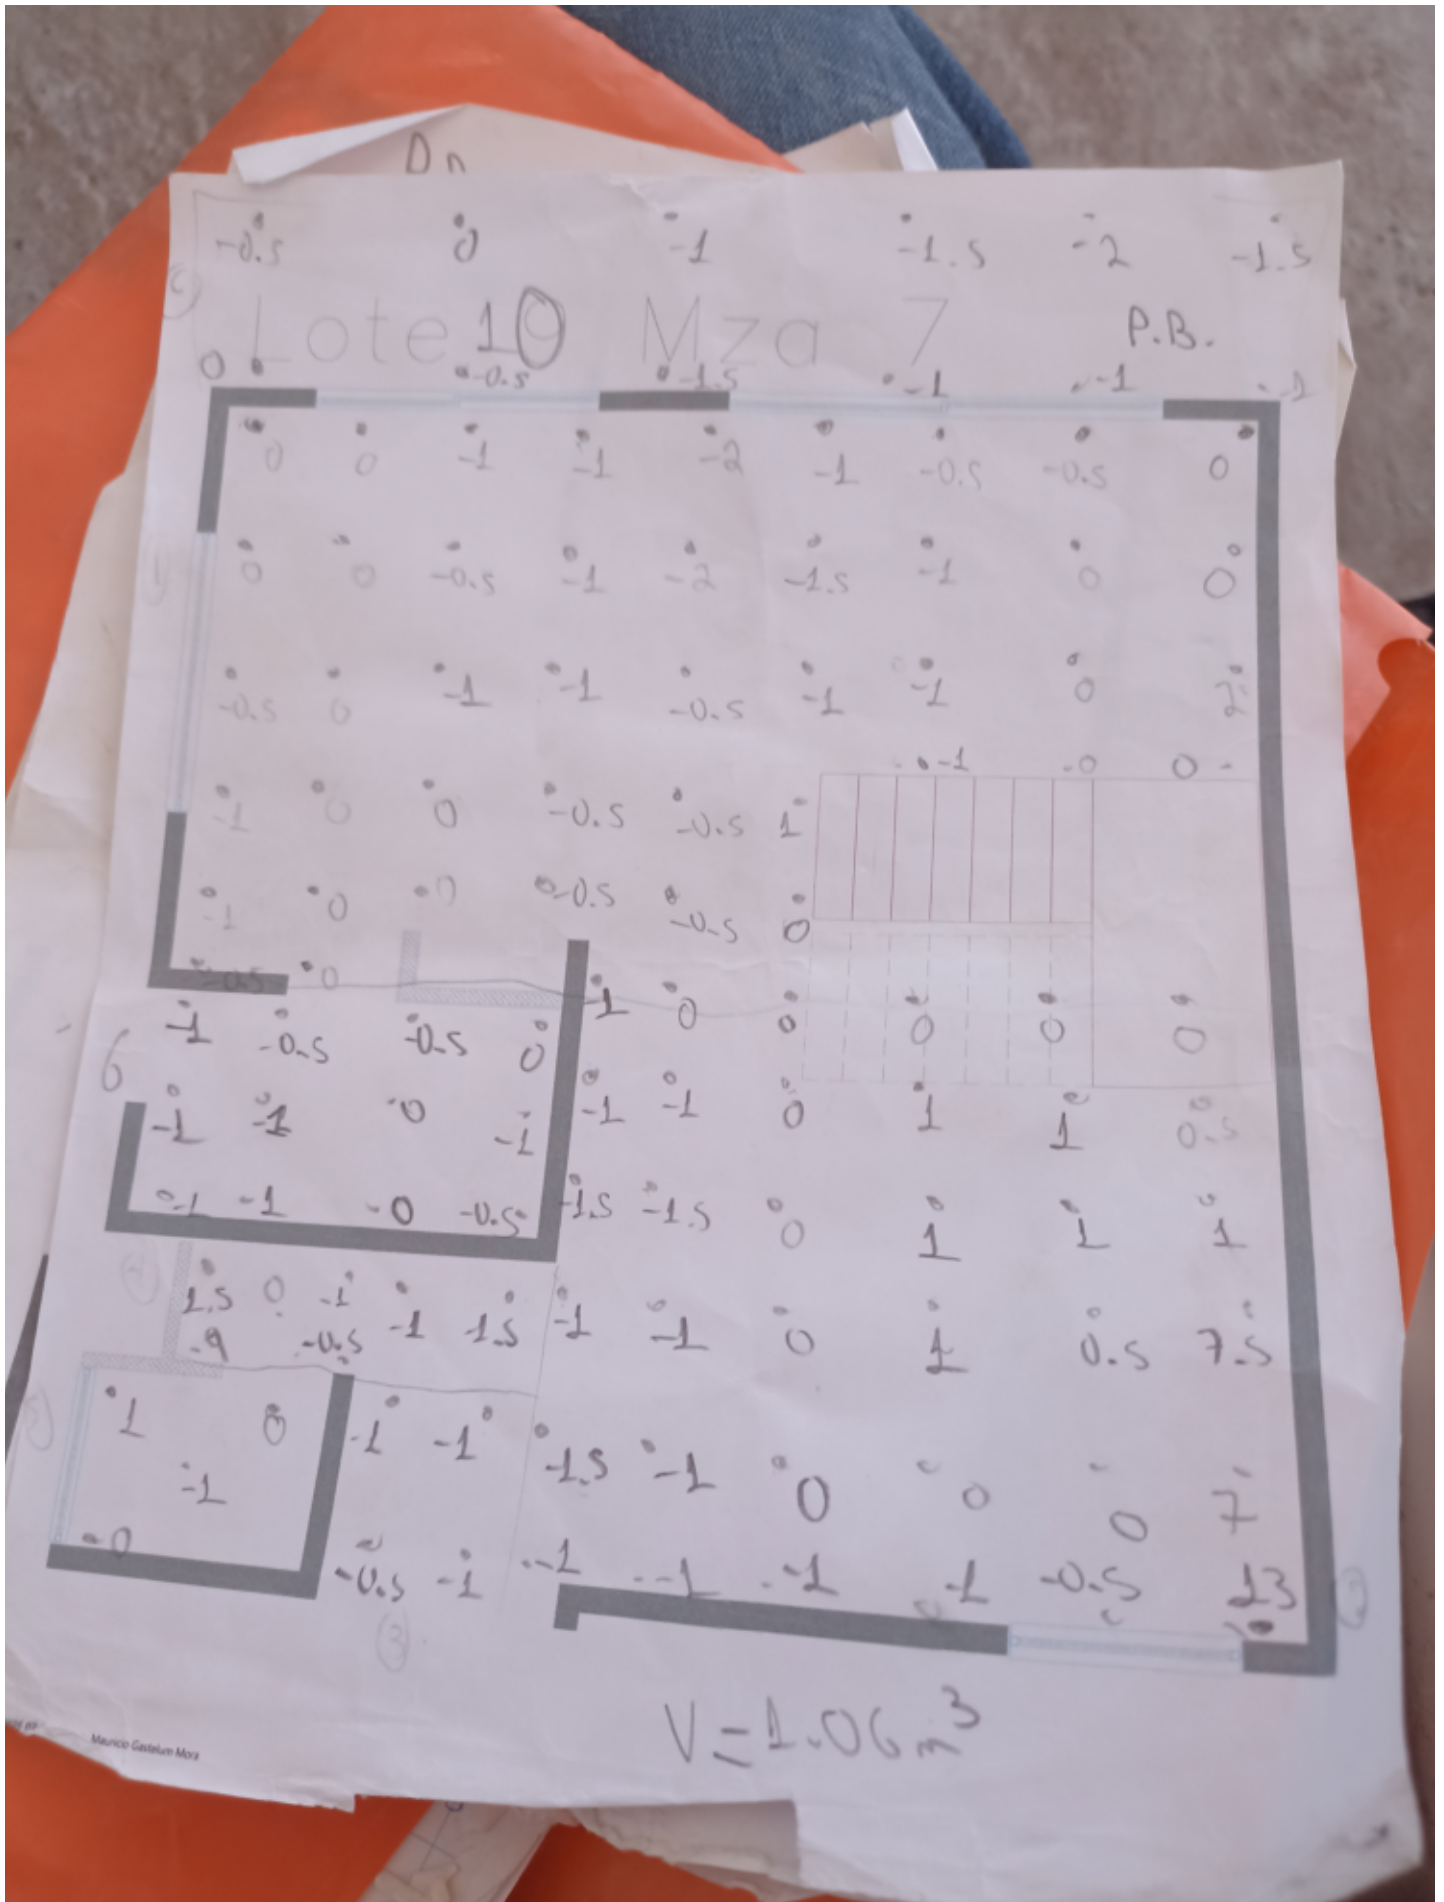

LOTE 10 · MZA 7 (MERLOT) — PLANTA ALTA

Hoja digitalizada · 58.25 m² · prom. 2.50 cm · mortero 1.50 m³ · hoja: V=1.46 m3

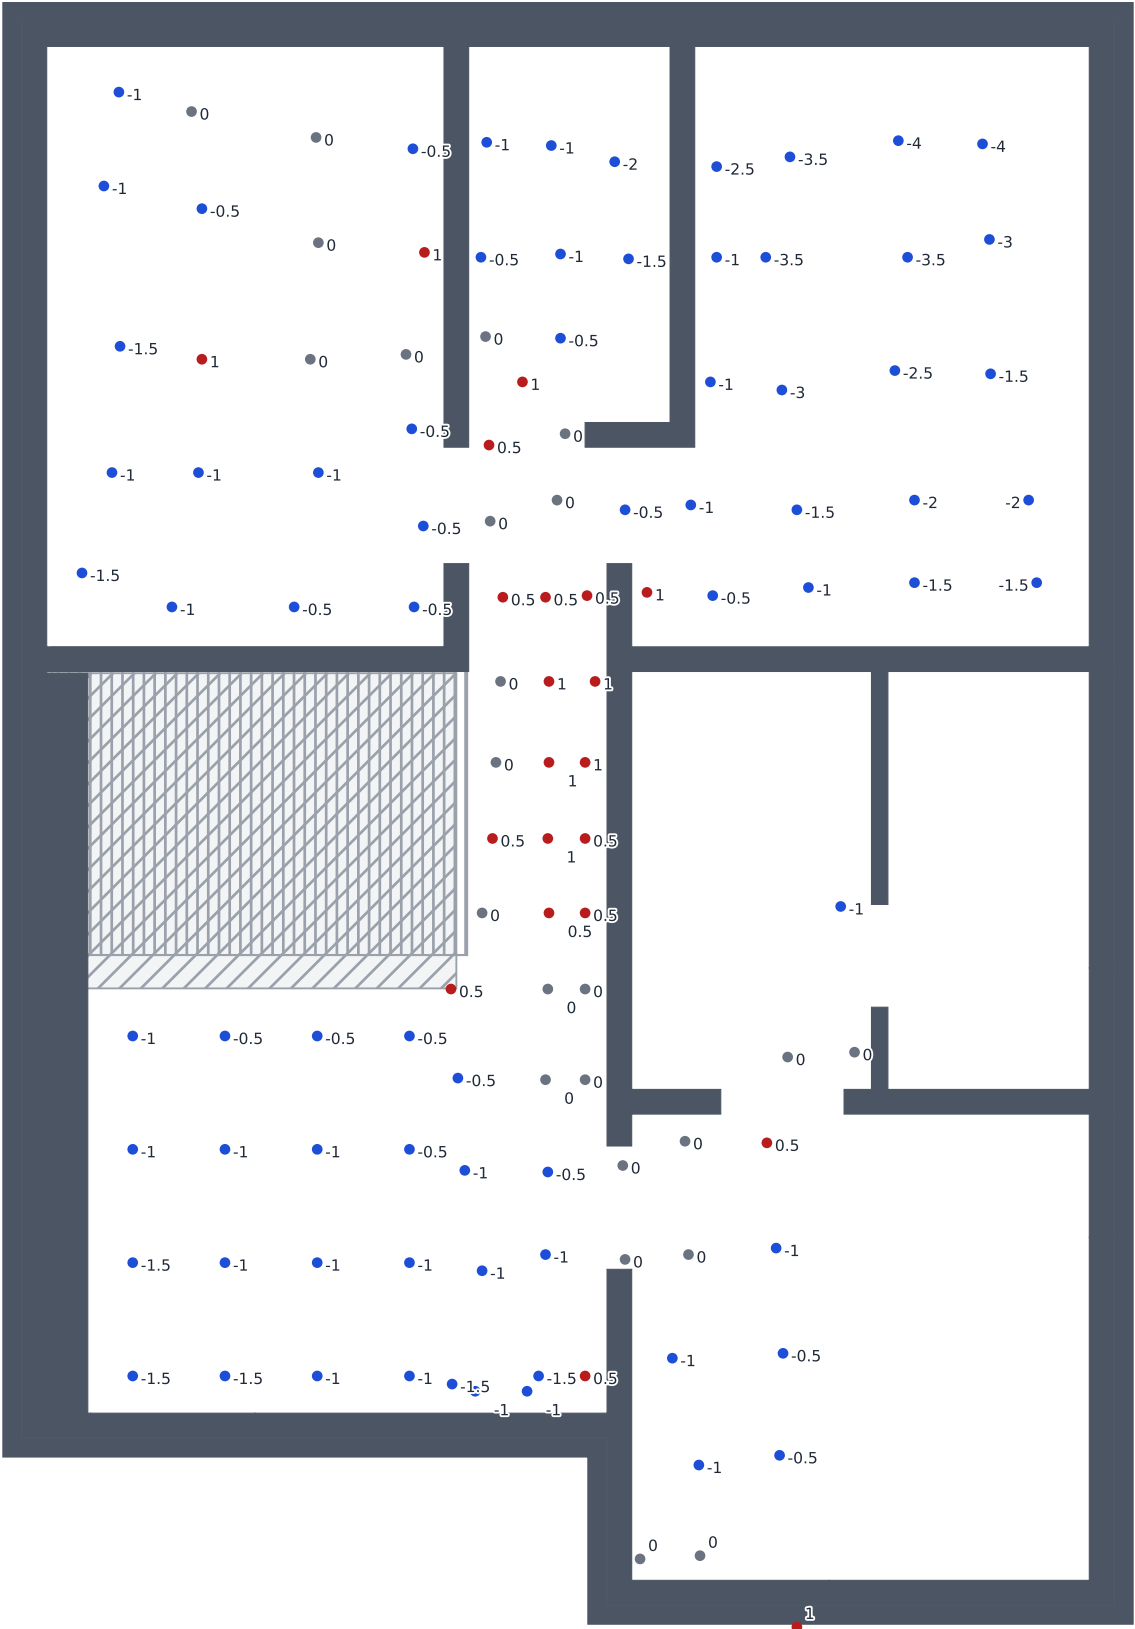

● Relleno (cota -) ● Corte (cota +) ● A nivel (0) ▨ Escalera (hueco)

